

AVANCE FISICO


CONTRATO: APITUX-GAFI-S-4/2019

PROVEEDOR: ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES DE ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

VIGENCIA CONTRATO: 02 DE MAYO DEL 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

AVANCE REAL	
AVANCE	PORCENTAJE
MAYO	4.16%
JUNIO	8.32%
JULIO	12.48%
AGOSTO	16.64%
SEPTIEMBRE	20.80%
OCTUBRE	24.96%
NOVIEMBRE	29.12%
DICIEMBRE	33.28%
ENERO	37.44%
FEBRERO	45.76%
MARZO	49.92%
ABRIL	54.08%
MAYO	58.24%
JUNIO	62.40%
JULIO	66.56%
AGOSTO	70.72%
SEPTIEMBRE	74.88%
OCTUBRE	79.04%
NOVIEMBRE	83.20%
DICIEMBRE	87.36%
ENERO	91.52%
FEBRERO	95.68%
MARZO	97.00%
ABRIL	100.00%

AVANCE PROGRAMADO	
PERIODO	PORCENTAJE
MAYO	4.16%
JUNIO	8.32%
JULIO	12.48%
AGOSTO	16.64%
SEPTIEMBRE	20.80%
OCTUBRE	24.96%
NOVIEMBRE	29.12%
DICIEMBRE	33.28%
ENERO	37.44%
FEBRERO	45.76%
MARZO	49.92%
ABRIL	54.08%
MAYO	58.24%
JUNIO	62.40%
JULIO	66.56%
AGOSTO	70.72%
SEPTIEMBRE	74.88%
OCTUBRE	79.04%
NOVIEMBRE	83.20%
DICIEMBRE	87.36%
ENERO	91.52%
FEBRERO	95.68%
MARZO	97.00%
ABRIL	100.00%

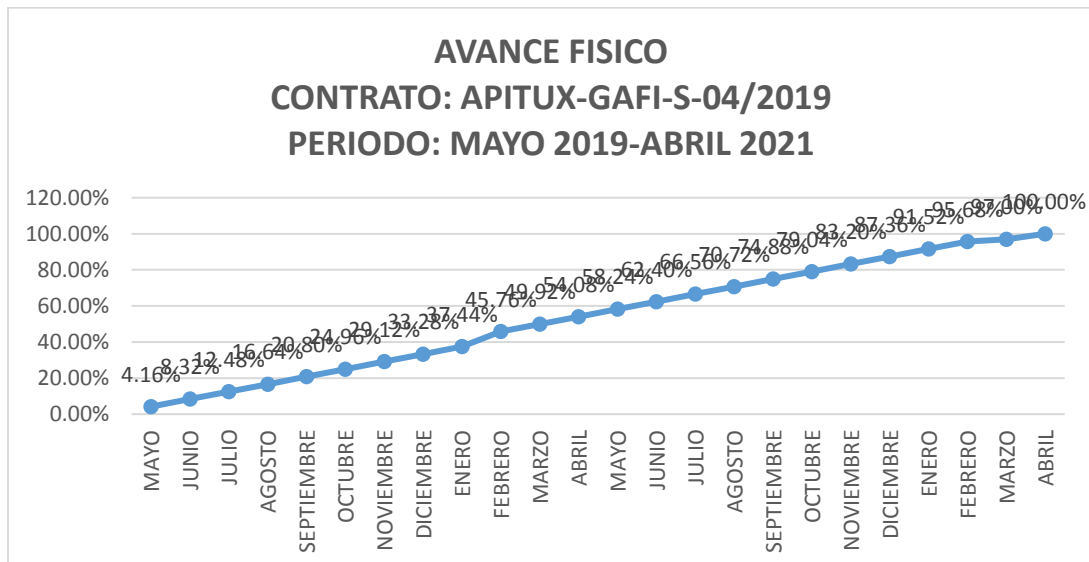

AVANCE FINANCIERO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-4/2019

**PROVEEDOR: ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES DE ELECTROCONSTRUCCIONES,
S.A. DE C.V.**

VIGENCIA CONTRATO: 02 DE MAYO DEL 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

AVANCE	PORCENTAJE
PROGRAMADO	100%
REAL	100%

