



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN



SCT
SECRETARIA DE
COMERCIO EXTERNO
Y TRANSPORTES

REPORTE SEMANAL DE OBRA

REPORTE SEMANAL N° 01
DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2017

FECHA DEL REPORTE: 15-may-17 Período Reportado: DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2017

Contrato: No. **APTUX-GOIN-OP-04/17** Importe contratado S/IVA: \$1,687,865.79

Obra: **"REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN PARTE POSTERIOR DEL MUELLE FISCAL TRAMO II AGUAS ARRIBA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO EN TUXPAN VER."**

Contratista: **CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.**

Fecha de Inicio: 10/05/2017 Fecha de Terminó: 08/07/2017 Plazo: 60 Días

AVANCE FISICO FINANCIERO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad proyecto	Cantidad prog acum	Precio Unitario	Importe Prog Acum	Cantidad acumReal	Avance financ real(\$)	Avance fisico Real (%)
1	Trazo y nivelación del área de trabajo, incluye localización del banco de nivel de proyecto, traslado de niveles, coordenadas, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T.	M2	1,080.00	360.00	\$ 17.25	\$ 6,210.00	0.00	\$0.00	0.00
2	Demolición de losa de concreto hidráulico f'c=250 kg/cm2 hasta un espesor de 20 cm incluye: trazo, corte con disco de diamante para delimitar área de demolición, demolición con equipo mecánico, señalamientos de peligro, manobras.	M3	216.00	-	\$ 878.03	\$ -	0.00	\$0.00	0.00
3	Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de material excepto roca, de (0.00 a 1.00) m de profundidad, para alojar las estructuras de acuerdo a proyecto. Incluye: Afine de taludes, compactación de la superficie del fondo al noventa por ciento.	M3	270.00	-	\$ 127.56	\$ -	0.00	\$0.00	0.00
4	Formación de base hidráulica de 0.20 m de espesor, mejorada con cemento pórtland a razón del 4 % del P.V.S.M del material definido en la prueba AASHTO modificada, compactación al cien por ciento (100 %) incluye Suministro y	M3	216.00	-	\$ 1,052.22	\$ -	0.00	\$0.00	0.00
5	Construcción de registro para descarga de agua pluvial de 60x60x60cms (medidas exteriores) a base de tabique rojo recocido de 7x14x28 cm y tapa a base de concreto f'c=250 kg/cm2 armado con varilla corrugada de 3/8" diám. Incluye	PZA	2.00	-	\$ 1,753.45	\$ -	0.00	\$0.00	0.00
6	Construcción de canal a base de concreto f'c=250 kg/cm2 para red de drenaje pluvial de 30 cm de ancho por 25 cm de profundidad, de acuerdo a características indicadas en proyecto, incluye suministro e instalación de parrilla marca Irving tipo	ML	83.00	-	\$ 1,924.83	\$ -	0.00	\$0.00	0.00
7	Suministro, habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo Fy=4200kg/cm2 del #3 como se indica en el proyecto Incluye habilitado, dobleces, silietas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, desperdicios, consumibles, materiales, mano de	KG	4,352.00	-	\$ 25.48	\$ -	0.00	\$0.00	0.00
8	Losa de concreto hidráulico de 25 cm de espesor (con módulo de ruptura a la flexión de MR 45 kg/cm2 clase 1 con peso volumétrico superior a 2.2 ton/m3 en estado fresco, debiendo utilizar agregado grueso con peso específico superior a 2.6 ton/m3	M3	269.00	-	\$ 3,515.34	\$ -	0.00	\$0.00	0.00

Avance Programado Acumulado al: 14-may-17 \$ 6,210.00

Avance Real Acumulado al: 14-may-17 \$0.00

Monto Contratado:	\$1,687,865.79	%
Porcentaje Global de obra Programada:		0.37
Porcentaje de cumplimiento Global de obra Real:		0.00
Desviación:		-0.37

RESUMEN		
ESTADO FINANCIERO		
PROGRAMADO	EROGADO	ATRASO
\$ 6,210.00	\$0.00	\$6,210.00

COMENTARIOS GENERADOS:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA EN EL PRESENTE PERIODO:

- 1.- Inicio de los trabajos:** La empresa contratista realiza tramites de documentación para el ingreso del personal, maquinaria y equipo, durante este periodo se realizaron plasticas de Calidad Ambiental SST al personal de la empresa Construcciones y Montajes de Veracruz S.A. de C.V. así como al personal de la supervisión de obra impartida por la Bióloga Cella Padron Valdez Coordinadora de Ecología.
- 2.- Reporte del estado ambiental:** Durante este periodo la contratista realiza tramites para contar con Sanimoviles en el área de trabajo de acuerdo al numero de personal que contará dentro de la obra así mismo se esta en espera de la relación del personal.
- 3.- Maquinaria y Equipo:** La empresa contratista realiza tramites de documentacio para el ingreso de Maquinaria y Equipo de construcción.
- 4.- Personal en Obra:** La empresa contratista a la fecha realiza tramites de documentación para el ingreso de personal a las instalaciones del área donde se realizaran los trabajos.

Conclusiones: A este periodo que se informa se tiene programado un avance global acumulado del 0.37% de acuerdo al programa de obra a la fecha se tiene un avance global real acumulado del 0.00%, existiendo un atraso de 0.37%. Que corresponde a \$6,210.00. Se informa que durante este periodo se realizaron tramites de solicitud de autorización ante la administración de la ADUANA para el ingreso de personal, maquinaria y equipo de construcción que se empleara en la obra, quedando en espera que la próxima semana se recupere este atraso ya que la empresa contratista cuenta con todos los elementos para poder realizar la obra.

<p>ELABORO</p> <p>ARQ. GUMARO PEREZ UGALDE SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN</p>	<p>VERIFICO</p> <p>ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES RESIDENTE DE SERVICIO</p>	1 DE 4
---	---	--------



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

SCT

SECRETARÍA DE
COMERCIO ACUÍCOLAS
Y TRANSPORTES



DATOS DE LA OBRA

REPORTE SEMANAL N° 01
DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2017

CONTRATO No: **APTUX-GOIN-OP-04H7**
CONTRATISTA: **CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.**
OBRA: **"REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN PARTE POSTERIOR DEL MUELLE FISCAL, TRAMO II AGUAS ARRIBA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO EN TUXPAN VER."**
MONTO: **\$1,687,868.79**
FECHA DE REPORTE: **16-may-17**

PLAZOS DE EJECUCION


INICIO	ORIGINAL	PRORROGADA	REPROGRAMACION	REAL	AMP PLAZO
TERMINACION	10/05/2017				
PLAZO (DÍAS NAT)	08/07/2017				80

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS


AVANCES SEMANALES FÍSICOS FINANCIEROS PROGRAMADOS VS. REALES
ACUMULADOS

SEMANA	INICIO	TERMINO	PROGRAMADO	REAL	%PROGRAMADO	% REAL
1	10/05/2017	SEM 1 14/MAY/17	6,210.00	0.00	0.37	0.00
2	15/05/2017	SEM 2 21/MAY/17	93,337.49		5.53	
3	22/05/2017	SEM 3 28/MAY/17	214,816.90		12.73	
4	29/05/2017	SEM 4 04/JUN/17	375,416.96		22.24	
5	05/06/2017	SEM 5 11/JUN/17	673,889.73		39.91	
6	12/06/2017	SEM 6 18/JUN/17	971,982.50		57.59	
7	19/06/2017	SEM 7 25/JUN/17	1,246,843.31		73.86	
8	26/06/2017	SEM 8 02/JUL/17	1,577,053.31		93.43	
9	03/07/2017	SEM 10 08/JUL/17	1,687,865.79		100.00	

"GRAFICA AVANCE FINANCIERO SEMANAL PROGRAMADO VS. REAL"

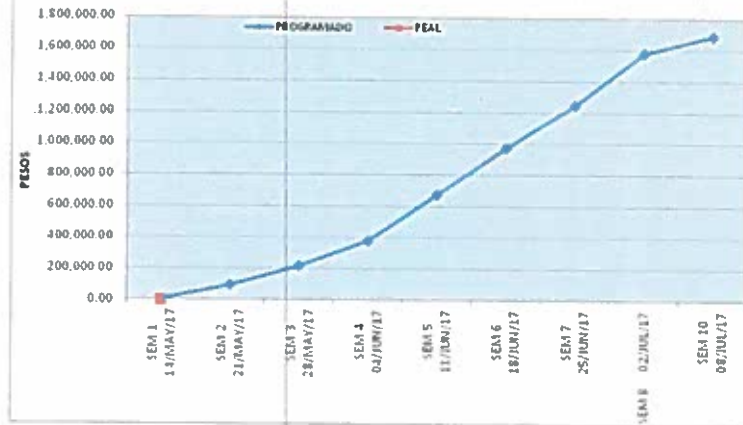

"GRAFICA AVANCE FÍSICO SEMANAL PROGRAMADO VS. REAL"

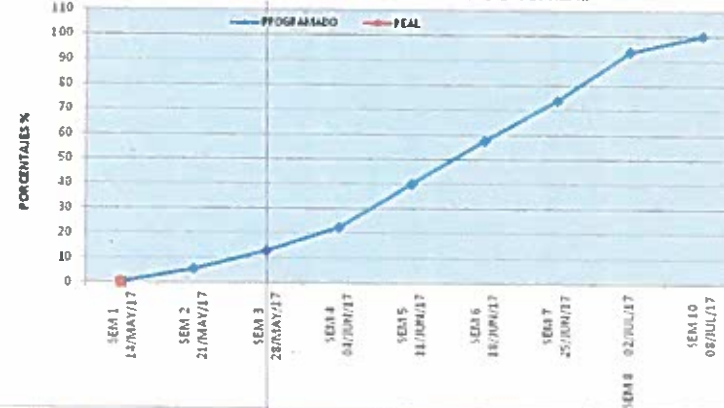

ELABORó

ARQ. GUMARO PÉREZ UGALDE
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISIÓN

VERIFICó

ING. BLANCA BEATRIZ CHOE-MONALES
RESIDENTE DE SERVICIO

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN

Arq. Gumaro Pérez Ugalde

R.F.C. PEUG-831298-CMY CURP: PEUG831204HYZGCM08



SUPERVISIÓN DE APOYO PARA EL CONTROL DE LAS OBRAS
DERIVADO DEL CONTRATO
APITUX-GOIN-SRO-06/17



TUXPAN

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTRUCCION

SCT

SECRETARÍA DE
COMERCIO
Y TRANSPORTES



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN PARTE POSTERIOR DEL MUELLE FISCAL TRAMO II AGUAS ARRIBA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO EN TUXPAN VER."
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.
IMPORTE DEL CONTRATO: 161,687,869.79
CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-0417
FECHA DE REPORTE: 15-may-17

REPORTE SEMANAL N° 01
DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2017

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERIODO ANTER.		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR		
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	
1	Trazo y nivelación del área de trabajo incluye localización del banco de nivel de proyecto, traslado de niveles coordinados, materiales mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto P.U.O.T. (E.P.O.T.)	M2	1,080.00	\$ 17.25	\$ 18,630.00	1.10	10/05/2017	24/05/2017	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	18,630.00
2	Demolición de losa de concreto hidráulico f'c=250 kg/cm ² hasta un espesor de 20 cm incluye trazo, corte con disco de diamante para delimitar área de demolición, demolición con equipo mecánico, señalamientos de peligro, maniobras, consumibles, retro del	M3	216.00	\$ 878.03	\$ 189,654.48	11.24	15/05/2017	03/06/2017	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	189,654.48
3	Excavación por medios mecánicos en cualquier tipo de material excepto roca de (0.00 a 1.00) m de profundidad para alojar las estructuras de acuerdo a proyecto. Incluye Aline de taludes, compactación de la superficie del fondo al noventa por ciento (90%)	M3	270.00	\$ 127.56	\$ 34,441.20	2.04	15/05/2017	03/06/2017	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	34,441.20
4	Formación de base hidráulica de 0.20 m de espesor mejorada con cemento Portland a razón del 4 % del PYSM del material, definido en la prueba AASHTO modificada, compactación al cien por ciento (100 %) incluye Suministro y colocación de los materiales	M3	216.00	\$ 1,092.22	\$ 235,919.52	13.98	24/05/2017	22/06/2017	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216.00	235,919.52
5	Construcción de registro para descarga de agua pluvial de 60x60x60cms (medidas exteriores) a base de tabique rojo recocido de 7x14x28 cm y tapa a base de concreto f'c=250 kg/cm ² armado con varilla corrugada de 3/8" diam. Incluye demoliciones sobre	PZA	2.00	\$ 1,753.45	\$ 3,506.90	0.21	02/07/2017	04/07/2017	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3,506.90
6	Construcción de canal a base de concreto f'c=250 kg/cm ² para red de drenaje pluvial de 30 cm de ancho por 25 cm de profundidad, de acuerdo a características indicadas en proyecto. Incluye suministro e instalación de parrilla marca Irving tipo (S-06 de 4.8x25.4mm de	ML	83.00	\$ 1,924.63	\$ 159,744.29	9.46	28/05/2017	08/07/2017	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	159,744.29
7	Suministro habilitado, armado y colocación de acero de refuerzo fy=4200kg/cm ² del #3 como se indica en el proyecto. Incluye habilitado, dobleses, sietas, alambre, ganchos, escuadras, traslapes, desperdicios, consumibles, materiales, mano de obra	KG	4,352.00	\$ 25.48	\$ 110,888.96	6.57	03/06/2017	03/07/2017	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,352.00	110,888.96
8	Losa de concreto hidráulico de 25 cm de espesor con módulo de ruptura a la flexión de MR 45 kg/cm ² clase 1 con peso volumétrico superior a 2.2 ton/m ³ en estado fresco, debiendo utilizarse agregado grueso con peso específico superior a 2.6 ton/m ³ acabado	ML	266.00	\$ 3,515.34	\$ 935,080.44	55.40	04/06/2017	03/07/2017	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	935,080.44
TOTALES						1,687,869.79	100.00					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,869.79	1,687,869.79
											0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,869.79	1,687,869.79
											Porcentaje global de Obra:		100.00		100.00		100.00	
											Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:		0.00		0.00		0.00	
											Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:		0.00		0.00		0.00	

ELABORÓ
ARQ. GUMARO PEREZ UGALDE
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION

VERIFICÓ
ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ BORALES
RESIDENTE DE SERVICIO



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



CONTRATO

APITUX-GOIN-OP-04/17

NOMBRE DE LA OBRA:

"REHABILITACION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN PARTE POSTERIOR DEL MUELLE FISCAL TRAMO II AGUAS ARRIBA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO EN TUXPAN VER."

PERIODO E LA OBRA

10/05/2017 AL 14/08/2017

CONTRATISTA:

CONSTRUCCIONES Y MONTAJES DE VERACRUZ, S.A. DE C.V.

FECHA DE REPORTE:

15-may-17

REPORTE SEMANAL N° 01
DEL 10 AL 14 DE MAYO DE 2017

REPORTE FOTOGRAFICO



Platica impartida por la Biologa Celia Padron Valdez Coordinadora de Ecologia, sobre la Calidad Ambiental SST a personal de la empresa Construcciones y Montajes de Veracruz, S.A de C.V que sera la encargada de ejecutar la obra asi como tambien personal de Supervision de Obra.

ELABORÓ

ARQ. GUMARO PEREZ UGALDE.
SUPERINTENDENTE DE SUPERVISION

VERIFICÓ

ING. BLANCA-BEATRIZ CRUZ MORALES
RESIDENTE DE SERVICIO
