

## AVANCE FISICO


**CONTRATO: APITUX-GAFI-S-4/2019**

**PROVEEDOR: ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES DE ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

**VIGENCIA CONTRATO: 02 DE MAYO DEL 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

AVANCE REAL	
AVANCE	PORCENTAJE
MAYO	4.16%
JUNIO	8.32%
JULIO	12.48%
AGOSTO	16.64%
SEPTIEMBRE	20.80%
OCTUBRE	24.96%
NOVIEMBRE	29.12%
DICIEMBRE	33.28%
ENERO	37.44%
FEBRERO	45.76%
MARZO	49.92%
ABRIL	54.08%
MAYO	58.24%
JUNIO	62.40%

AVANCE PROGRAMADO	
PERIODO	PORCENTAJE
MAYO	4.16%
JUNIO	8.32%
JULIO	12.48%
AGOSTO	16.64%
SEPTIEMBRE	20.80%
OCTUBRE	24.96%
NOVIEMBRE	29.12%
DICIEMBRE	33.28%
ENERO	37.44%
FEBRERO	45.76%
MARZO	49.92%
ABRIL	54.08%
MAYO	58.24%
JUNIO	62.40%

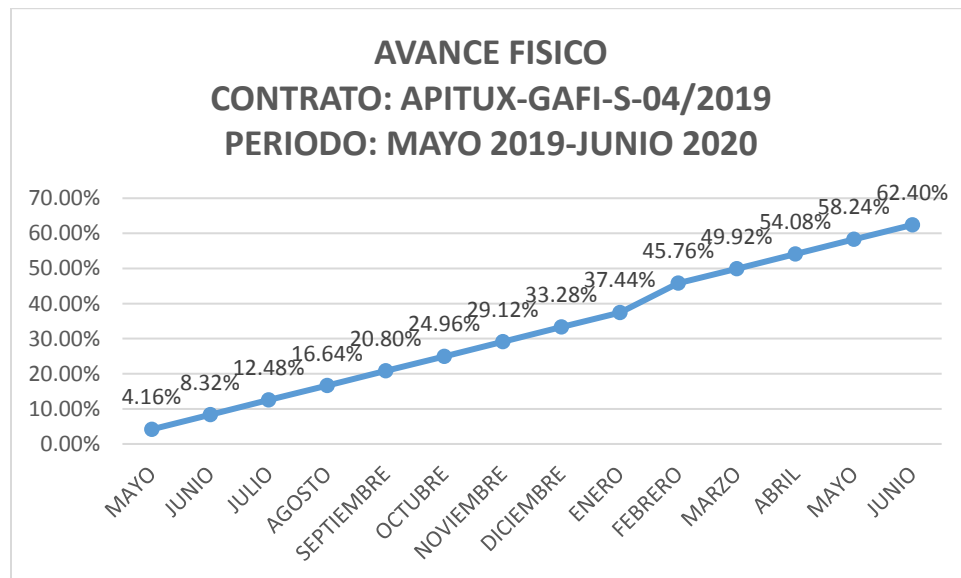

## AVANCE FINANCIERO

**CONTRATO: APITUX-GAFI-S-4/2019**

**PROVEEDOR: ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES DE ELECTROCONSTRUCCIONES,  
S.A. DE C.V.**

**VIGENCIA CONTRATO: 02 DE MAYO DEL 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2021**

AVANCE	PORCENTAJE
PROGRAMADO	62%
REAL	62%

