

INFORME DE AVANCE FISICO


CONTRATO: APITUX-GAFI-S-16/2018

PROVEEDOR: CONSTRUCCIONES CIVILES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V

VIGENCIA CONTRATO: 16 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018

AVANCE REAL	
PERIODO	PORCENTAJE
ABRIL	50%
MAYO	100%

AVANCE PROGRAMADO	
PERIODO	PORCENTAJE
ABRIL	50%
MAYO	100%

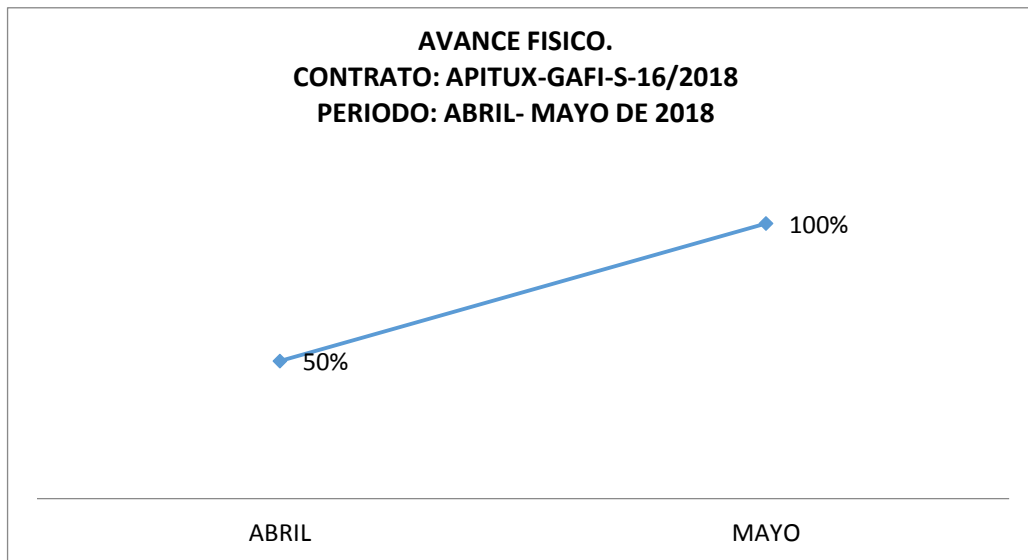

INFORME DE AVANCE FINANCIERO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-16/2018

PROVEEDOR: CONSTRUCCIONES CIVILES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V.

VIGENCIA CONTRATO: 16 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2018

AVANCE	PORCENTAJE
PROGRAMADO	100%
REAL	100%

