

REPORTE SEMANAL DEL SERVICIO

FECHA DEL REPORTE: 07-oct-16 Periodo Reportado: REPORTE SEMANA N° 01 DEL 01/10/2016 al 05/10/2016

Contrato: No. APITUX-GOIN-SRO-019/16 Importe contratado S/IVA: \$12,000.00

Obra: "ACTIVIDADES DE PODAS DE REDUCCIÓN DE COPA EN ALTURA DE LOS EJEMPLARES QUE OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD DEL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO LOCALIZADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO, EN EL PUERTO DE TUXPAN,VER."

Contratista: CONSTRUCCIONES PRAGA S.A. DE C.V.

Fecha de Inicio: 01/10/2016 Fecha de Termino: 05/01/2016 Plazo: 23 DIAS

AVANCE FISICO FINANCIERO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad proyecto	Cantidad prog acum	Precio Unitario	Importe Prog Acum	Cantidad acumReal	Avance financ real(\$)	Avance fisico Real (%)
1	"ACTIVIDADES DE PODAS DE REDUCCIÓN DE COPA EN ALTURA DE LOS EJEMPLARES QUE OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD DEL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO LOCALIZADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO, EN EL PUERTO DE TUXPAN,VER."	P.G.	1.00	1.00	12,000.00	\$ 12,000.00	1.00	\$12,000.00	100.00

Avance Programado Acumulado al: 12-dic-16 \$ 12,000.00

Avance Real Acumulado al: 12-dic-16 \$12,000.00

Monto Contratado:		\$12,000.00	%
Porcentaje Global de obra Programada:		100.00	
Porcentaje de cumplimiento Global de obra Real:		100.00	
Desviación:		0.00	

RESUMEN ESTADO FINANCIERO		
PROGRAMADO	EROGADO	ATRASO
\$ 12,000.00	\$12,000.00	\$0.00

COMENTARIOS GENERADOS:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA EN EL PRESENTE PERIODO:

1.- "ACTIVIDADES DE PODAS DE REDUCCIÓN DE COPA EN ALTURA DE LOS EJEMPLARES QUE OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD DEL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO LOCALIZADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO, EN EL PUERTO DE TUXPAN,VER." Se hizo entrega del area de los trabajos el día 01/10/2016 asi mismo, le fueron indicados los ejemplares a reducir copa,mismos que fueron realizados en el periodo del 01/10/2016 al 05/10/2016 en las siguientes balizas: Baliza "EL COCAL", localizada al margen izquierda del Rio Tuxpan, se realizo el desrame de la palmera de una altura aproximada de 10 metros, quedando unicamente el tronco y la corona de la palma, ya desramada retirando el material producto del corte; en la Baliza "COBOS" localizada al margen derecha Rio Tuxpan, se realizo el desrame de ficus a una altura de 12 a 14 m y arbol de humo de altura aproximada de 9 m mejorando visibilidad de la torre, asi como desrame de arbol de almendra altura variable de 15m, al finalizar los trabajos se realizo el retiro de ramas producto del corte; en la Baliza "SEMINARIO", localizada al margen derecha del Rio Tuxpan, se reducio la copa en cuatro especies de alturas de 9 a 12 metros. Los trabajos concluyeron el día 05 de octubre mismo que notificado por un escrito por parte del prestador de servicio. El día 07 de octubre se le comunica mediante oficio No. APITUX-GOIN-1789/2016, que el día 10 de octubre del presente se llevara a cabo la inspeccion fisica de los trabajos.

2.- **Reporte del estado ambiental:** Se da seguimiento a lo relacionado a seguridad e higiene, personal del contratista cuenta con el equipo de seguridad adecuado, la basura que se genera en la obra es depositada en contenedores, que la maquinaria y equipo que se está utilizando no presente fugas de aceite.

3.-**Maquinaria y Equipo:** La empresa contratista cuenta en la obra con el siguiente equipo: herramienta menor.

4.-**Personal en Obra:** La empresa contratista cuenta con el siguiente personal en obra: (1) cabo, (4) ayudantes para maniobras, dicho personal uso equipo de proteccion de personal basico(casco, botas, overol, guantes, lentes de seguridad y faja lumbar), suficiente de acuerdo a las actividades que se estan realizando hasta el momento.

**Conclusiones:** . A este periodo que se informa se tiene programado un avance global acumulado del 100% de acuerdo al programa de obra, a la fecha se tiene un avance global real acumulado del 100%, concluyendo los trabajos exitosamente.

<p>ELABORÓ:</p> <p>ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ RESIDENTE DE SERVICIO</p>	<p>VERIFICÓ:</p> <p>ING. ADOLFO GARCÉZ CRUZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA</p>	<p>1 DE 4</p>
---	--	---------------





**CONTRATO**

APITUX-GOIN-SRO-019/16

**NOMBRE DEL SERVICIO:**

"ACTIVIDADES DE PODAS DE REDUCCION DE COPA EN ALTURA DE LOS EJEMPLARES QUE OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD DEL SEÑALAMIENTO MARITIMO LOCALIZADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO, EN EL PUERTO DE

**PERIODO DEL SERVICIO:**

01/10/2016 AL 05/10/2016

**PRESTADOR DE SERVICIO:**

CONSTRUCCIONES PRAGA S.A. DE C.V

**FECHA DE REPORTE:**

07-oct-16

**REPORTE SEMANA N° 01**  
**DEL 01/10/2016 al 05/10/2016**

**REPORTE FOTOGRAFICO**



PODA Y DESRAME EN LA BALIZA "EL COCAL" LOCALIZADA AL MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO TUXPAN

ELABORÓ

ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ  
RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ  
ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

**CONTRATO**

**NOMBRE DEL SERVICIO:**

**PERIODO DEL SERVICIO:**

**PRESTADOR DE**

**SERVICIO:**

**FECHA DE REPORTE:**

APITUX-GOIN-SRO-019/16

"ACTIVIDADES DE PODAS DE REDUCCION DE COPA EN ALTURA DE LOS EJEMPLARES QUE OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD DEL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO LOCALIZADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO, EN EL PUERTO DE

01/10/2016 AL 05/10/2016


CONSTRUCCIONES PRAGA S.A. DE C.V

07-oct-16

REPORTE SEMANA N° 01

DEL 01/10/2016 al 05/10/2016

**REPORTE FOTOGRAFICO**

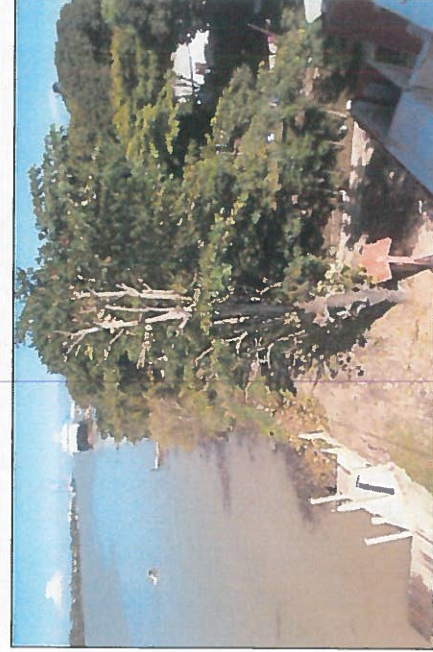

PODA Y DESRAME EN LA BALIZA " COBOS" LOCALIZADA AL MARGEN DERECHA DEL RÍO TUXPAN

ELABORÓ:

ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ  
RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ:

ING. ANOLFO GAREZ CRUZ

ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

CONTRATO

NOMBRE DEL SERVICIO:

PERIODO DEL SERVICIO:

PRESTADOR DE  
SERVICIO:

FECHA DE REPORTE:

APITUX-GOIN-SRO-019/16

"ACTIVIDADES DE PODAS DE REDUCCION DE COPA EN ALTURA DE LOS EJEMPLARES QUE OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD DEL SEÑALAMIENTO MARITIMO LOCALIZADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO, EN EL PUERTO DE

01/10/2016 AL 05/10/2016

CONSTRUCCIONES PRAGA S.A. DE C.V

07-oct-16

REPORTE SEMANA N° 01

DEL 01/10/2016 al 05/10/2016

REPORTE FOTOGRAFICO



PODA Y DESRAME EN LA BALIZA " COBOS" LOCALIZADA AL MARGEN DERECHA DEL RÍO TUXPAN

ELABORÓ

ING. ADELINA HEREDIA RAMIREZ  
RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ  
ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

**CONTRATO**

APITUX-GOIN-SRO-019/16

**NOMBRE DEL SERVICIO:**

"ACTIVIDADES DE PODAS DE REDUCCION DE COPA EN ALTURA DE LOS EJEMPLARES QUE OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD DEL SEÑALAMIENTO MARITIMO LOCALIZADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

**PERIODO DEL SERVICIO:**

01/10/2016 AL 05/10/2016

**PRESTADOR DE SERVICIO:**

CONSTRUCCIONES PRAGA S.A. DE C.V

**FECHA DE REPORTE:**

07-oct-16

**REPORTE SEMANA N° 01**

**DEL 01/10/2016 al 05/10/2016**

**REPORTE FOTOGRAFICO**



PODA Y DESRAME EN LA BALIZA "SEMINARIO" LOCALIZADA AL MARGEN DERECHA DEL RIO TUXPAN

ELABORÓ

ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ  
RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ  
ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
