



REPORTE SEMANAL DE OBRA

FECHA DEL REPORTE:	26-sep-16	Periodo Reportado:	REPORTE SEMANAL N° 01 DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Contrato: No.	APITUX-GOIN-OP-022/16	Importe contratado S/IVA:	\$48,882.24
Obra:	"MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE LA ADUANA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO TUXPAN, VER."		
Contratista:	C. JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS		
fecha de Inicio:	22/09/2016	Fecha de Terminó:	30/09/2016 Plazo: 9 Dias

AVANCE FISICO FINANCIERO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad proyecto	Cantidad prog acum	Precio Unitario	Importe Prog Acum	Cantidad acumReal	Avance financ real(\$)	Avance fisico Real (%)
1	Suministro e instalación de salida para alumbrado, incluye: descableado, limpieza de poliductos de ½", guiado y cableado aplicando código de colores cable cal.12 AWG, marca condomex o similar en calidad, conexiones y pruebas, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	SALIDA	23.00	23.00	564.50	\$ 12,983.50	8.00	\$4,516.00	34.78
2	Suministro e instalación de contacto duplex polarizado incluye: des cableado, limpieza de poliductos de ½" guiado y cableado aplicado código de colores cable Cal.10 AWG, marca condomex o similar en calidad conexiones, pruebas, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	SALIDA	18.00	9.00	664.06	\$ 5,976.54	6.00	\$3,984.36	33.33
3	Suministro e instalación de centro de carga QO2 e interruptor termomagnético de 2p x 30 AMPS incluye: cable en canalización a base de canaleta de 1 vía 20x10 mm de pvc, pruebas, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. P.U.O.T.	SALIDA	5.00	0.00	1,293.10	\$ -	3.00	\$3,879.30	60.00
4	Suministro y colocación de lámpara de sobreponer tipo arbotante LED de 15 W Incluye: consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA.	2.00	0.00	657.86	\$ -	1.00	\$657.86	50.00
5	Suministro e instalación de luminaria tipo sobreponer en techo incluye: consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA.	3.00	0.00	1,070.22	\$ -	1.00	\$1,070.22	33.33
6	Suministro e instalación de mezcladora marca HELVEX caliente-fría o similar en calidad, incluye: desmontaje de mezcladora existente y reposición, mangueras coflex para lavabo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA.	1.00	0.00	12,953.78	\$ -	0.00	\$0.00	0.00

Avance Programado Acumulado al:	25-sep-16	\$ 18,960.04	
Avance Real Acumulado al:	25-sep-16		\$14,107.74

Monto Contratado:	\$48,882.24	%
Porcentaje Global de obra Programada:		38.79
Porcentaje de cumplimiento Global de obra Real:		28.86
Desviación:		-9.93

RESUMEN		
ESTADO FINANCIERO		
PROGRAMADO	EROGADO	ATRASO
\$ 18,960.04	\$14,107.74	-\$4,852.30

COMENTARIOS GENERADOS:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA EN EL PRESENTE PERIODO:

1.- **Inicio de los trabajos:** Con fecha 22 de septiembre se hizo la entrega del área de trabajo para el mantenimiento menor a instalaciones eléctricas en edificio de la aduana en el interior del recinto portuario de esta ciudad, en esta primer semana el contratista realizo los trabajos de des cableado, limpieza de poliductos, guiado y cableado en área de baño y oficina de la aduana de Tuxpan, dejo listas las salidas eléctricas para alumbrado, sustituyo los contactos dúplex y de todos los accesorios eléctricos como son tapas, apagadores, instalo 1 lámpara de sobreponer tipo arbotante LED de 15 w, así como la instalación de 3 centros de carga para protección de aires acondicionado en oficinas de la aduana. Se realizaron pruebas de operación pertinentes y chequeos de voltaje, al término de la cada jornada, así como la limpieza del área de trabajo.

2.- **Reporte del estado ambiental:** Se da seguimiento a lo relacionado a seguridad e higiene, personal del contratista cuenta con el equipo de seguridad adecuado, la basura que se genera en la obra es depositada en contenedores.

3.- **Maquinaria y Equipo:** La empresa contratista cuenta en la obra con el siguiente equipo: (2) escalera de aluminio, (5) equipo de protección de obra, (1) stock de herramienta menor. (2) amperímetro, (1) voltímetro.

4.- **Personal en Obra:** La empresa contratista cuenta con el siguiente personal en obra: (1) Superintendente de construcción, (1) oficial albañil, (1) ayudante albañil y (1) oficial eléctrico, (2) ayudantes eléctricos, personal suficiente de acuerdo a las actividades que se están realizando hasta el momento.

Conclusiones: A este periodo se informa que se tiene programado un avance global acumulado del 38.79% de acuerdo al programa de obra, a la fecha se tiene un avance global real acumulado del 28.86%, existiendo atraso del 9.93% de trabajo, debido a que la contratista durante este periodo se dedicó a realizar los trabajos en una área en específico por instrucciones de la aduana, se espera que la próxima semana la contratista acelere el ritmo de trabajo y así pueda recuperar el porcentaje de obra programado ya que la contratista cuenta con todos los elementos para poder realizar la obra.

ELABORÓ

ING. JESÚS ALBERTO RUIZ LUNA
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN



TUXPAN
COMISIÓN ADMINISTRATIVA DE FISCOS DEL
ESTADO DE VERACRUZ

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

SCT
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



DATOS DE LA OBRA

CONTRATO No:	APITUX-GOIN-OP-022/16
CONTRATISTA:	C. JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS
OBRA:	"MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE LA ADUANA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO TUXPAN, VER."
MONTO:	\$48,882.24
FECHA DE REPORTE:	26-sep-16

PLAZOS DE EJECUCION

INICIO	ORIGINAL	PRORROGADA	REPROGRAMACION	REAL	AMP PLAZO
TERMINACION	22/09/2016				
PLAZO (DIAS NAT)	30/09/2016				9


PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

AVANCES SEMANALES FISICOS FINANCIEROS PROGRAMADOS VS. REALES


SEMANA	INICIO	TERMINO	ACUMULADOS			
			PROGRAMADO	REAL	%PROGRAMADO	% REAL
			0			
1	22-sep-16	SEM 1 25/sep/16	18,960.04	14,107.74	38.79	28.86
2	26-sep-16	SEM 2 30/sep/16	48,882.24		100.00	

REPORTE SEMANAL N° 01
DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016

"GRAFICA AVANCE FINANCIERO SEMANAL PROGRAMADO VS. REAL"

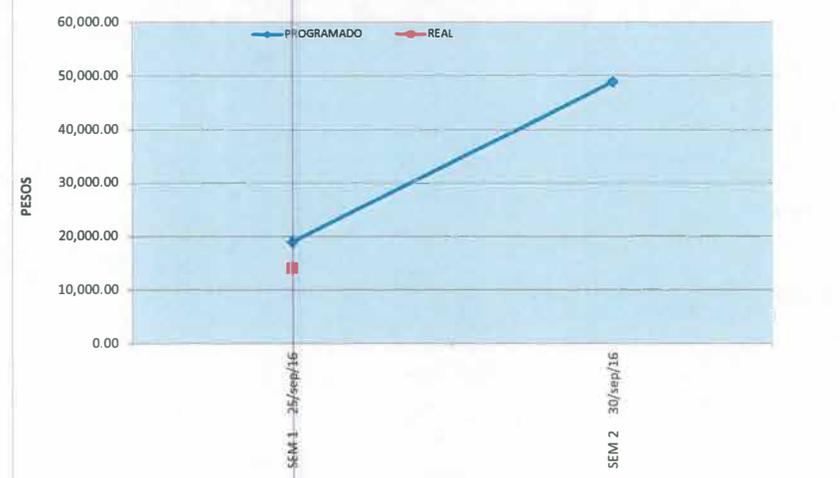

"GRAFICA AVANCE FÍSICO SEMANAL PROGRAMADO VS. REAL"

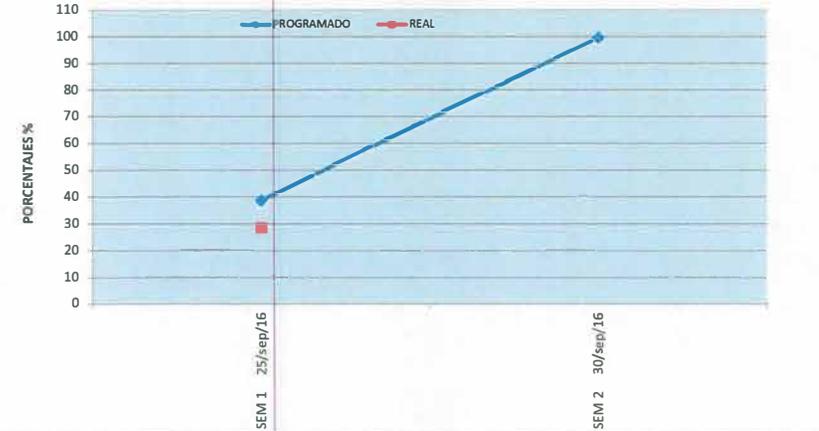

ELABORÓ

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO	APITUX-GOIN-OP-022/16			REPORTE SEMANAL N° 01 DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016
NOMBRE DE LA OBRA:	"MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE LA ADUANA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO TUXPAN, VER."			
PERIODO E LA OBRA	22/09/2016	AL	30/09/2016	
CONTRATISTA:	C. JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS			
FECHA DE REPORTE:	26-sep-16			

REPORTE FOTOGRAFICO



Suministro e instalación de salida para alumbrado, incluye: descableado, limpieza de poliductos de 1/2", guiado y cableado aplicando código de colores cable cal.12 AWG, marca condomex o similar en calidad, conexiones y pruebas, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.

ELABORÓ

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
 RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

ING. REBECA GONZALEZ MORALES
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO	APITUX-GOIN-OP-022/16		
NOMBRE DE LA OBRA:	"MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE LA ADUANA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO TUXPAN, VER."		
PERIODO E LA OBRA	22/09/2016	AL	30/09/2016
CONTRATISTA:	C. JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS		
FECHA DE REPORTE:	26-sep-16		

**REPORTE SEMANAL N° 01
DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

REPORTE FOTOGRAFICO



Suministro e instalación de contacto duplex polarizado incluye: des cableado, limpieza de poliductos de 1/2" guiado y cableado aplicado código de colores cable Cal.10 AWG, marca condumex o similar en calidad conexiones, pruebas, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.

ELABORÓ

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE LA ADUANA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO TUXPAN, VER."
 CONTRATISTA: C. JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$:48,882.24
 CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-022/16
 FECHA DE REPORTE: 26-sep-16

REPORTE SEMANAL N° 01
 DEL 22 AL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERDO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		P.O.R. EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
1	Suministro e instalación de salida para alumbrado, incluye: descableado, limpieza de poliductos de 1/2", guiado y cableado aplicando código de colores cable cal.12 AWG, marca condumex o similar en calidad, conexiones y pruebas, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	SALIDA	23.00	\$ 564.50	\$ 12,983.50	26.56	01/12/2016	04/12/2016	4	8.00	4,516.00	0.00	0.00	8.00	4,516.00	15.00	8,467.50
2	Suministro e instalación de contacto duplex polarizado incluye: descableado, limpieza de poliductos de 1/2" guiado y cableado aplicado código de colores cable Cal.10 AWG, marca condumex o similar en calidad conexiones, pruebas, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	SALIDA	18.00	\$ 664.06	\$ 11,953.08	24.45	04/12/2016	05/12/2016	2	6.00	3,984.36	0.00	0.00	6.00	3,984.36	12.00	7,968.72
3	Suministro e instalación de centro de carga QO2 e interruptor termomagnético de 20 x 30 AMPS incluye: cable en canalización a base de canaleta de 1 vía 20x10 mm de pvc, pruebas, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. P.U.O.T.	SALIDA	5.00	\$ 1,293.10	\$ 6,465.50	13.23	06/12/2016	09/12/2016	4	3.00	3,879.30	0.00	0.00	3.00	3,879.30	2.00	2,586.20
4	Suministro y colocación de lámpara de sobreponer tipo arbotante LED de 15 W incluye: consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA.	2.00	\$ 657.86	\$ 1,315.72	2.69	09/12/2016	16/12/2016	8	1.00	657.86	0.00	0.00	1.00	657.86	1.00	657.86
5	Suministro e instalación de luminaria tipo sobreponer en techo incluye: consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA.	3.00	\$ 1,070.22	\$ 3,210.66	6.57	17/12/2016	22/12/2016	6	1.00	1,070.22	0.00	0.00	1.00	1,070.22	2.00	2,140.44
6	Suministro e instalación de mezcladora marca HELVEX calentaría o similar en calidad, incluye: desmontaje de mezcladora existente y reposición, mangueras colflex para lavabo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA.	1.00	\$ 12,953.78	\$ 12,953.78	26.50	23/12/2016	24/12/2016	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	12,953.78
TOTALES					48,882.24	100.00					14,107.74	0.00	0.00	14,107.74	0.00	34,774.50	
											14,107.74	0.00	14,107.74	34,774.50			
											Porcentaje global de Obra:		100.00				
											Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:		26.86				
											Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:		71.14				

ELABORO

ING. JOSE ALBERTO RUIZ LUNA
 RESIDENTE DE OBRA

VERIFICO

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION



REPORTE SEMANAL DE OBRA

FECHA DEL REPORTE:	03-oct-16	Periodo Reportado:	REPORTE SEMANAL N° 02 DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
Contrato: No.	APITUX-GOIN-OP-022/16	Importe contratado S/IVA:	\$48,882.24
Obra:	"MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE LA ADUANA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO TUXPAN, VER."		
Contratista:	C. JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS		
fecha de Inicio:	22/09/2016	Fecha de Termino:	30/09/2016 Plazo: 9 Dias

AVANCE FISICO FINANCIERO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad proyecto	Cantidad prog acum	Precio Unitario	Importe Prog Acum	Cantidad acumReal	Avance financ real(\$)	Avance fisico Real (%)
1	Suministro e instalación de salida para alumbrado, incluye: descableado, limpieza de poliductos de ½", guiado y cableado aplicando código de colores cable cal.12 AWG, marca condumex o similar en calidad, conexiones y pruebas, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	SALIDA	23.00	23.00	564.50	\$ 12,983.50	23.00	\$12,983.50	100.00
2	Suministro e instalación de contacto duplex polarizado incluye: des cableado, limpieza de poliductos de ½" guiado y cableado aplicado código de colores cable Cal.10 AWG, marca condumex o similar en calidad conexiones, pruebas, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	SALIDA	18.00	18.00	664.06	\$ 11,953.08	18.00	\$11,953.08	100.00
3	Suministro e instalación de centro de carga QO2 e interruptor termomagnético de 2p x 30 AMPS incluye: cable en canalización a base de canaleta de 1 vía 20x10 mm de pvc, pruebas, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. P.U.O.T.	SALIDA	5.00	5.00	1,293.10	\$ 6,465.50	5.00	\$6,465.50	100.00
4	Suministro y colocación de lámpara de sobreponer tipo arbotante LED de 15 W Incluye: consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA.	2.00	2.00	657.86	\$ 1,315.72	2.00	\$1,315.72	100.00
5	Suministro e instalación de luminaria tipo sobreponer en techo incluye: consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA.	3.00	3.00	1,070.22	\$ 3,210.66	3.00	\$3,210.66	100.00
6	Suministro e instalación de mezcladora marca HELVEX caliente-fría o similar en calidad, incluye: desmontaje de mezcladora existente y reposición, mangueras coflex para lavabo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA.	1.00	1.00	12,953.78	\$ 12,953.78	1.00	\$12,953.78	100.00
Avance Programado Acumulado al:						30-sep-16	\$ 48,882.24		
Avance Real Acumulado al:						30-sep-16		\$48,882.24	

Monto Contratado:	\$48,882.24	%
Porcentaje Global de obra Programada:		100.00
Porcentaje de cumplimiento Global de obra Real:		100.00
Desviación:		0.00

RESUMEN		
ESTADO FINANCIERO		
PROGRAMADO	EROGADO	ATRASO
\$ 48,882.24	\$48,882.24	\$0.00

COMENTARIOS GENERADOS:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA EN EL PRESENTE PERIODO:

- Inicio de los trabajos:** Con fecha 22 de septiembre se hizo la entrega del área de trabajo para el mantenimiento menor a instalaciones eléctricas en edificio de la aduana en el interior del recinto portuario de esta ciudad, en esta segunda semana el contratista trabajo en las otras oficinas de la aduana y concluyo con los trabajos de des cableado, limpieza de poliductos, guiado y cableado, así como las salidas eléctricas para alumbrado, sustituyo los contactos dúplex y de todos los accesorios eléctricos como son tapas, apagadores, instalo la segunda lámpara de sobreponer tipo arbotante LED de 15 w en una de las oficinas. Concluyo con la instalación de los centros de carga para protección de aires acondicionado en oficinas de la aduana. Se realizaron pruebas de operación pertinentes y chequeos de voltaje, Por último sustituyo una mezcladora marca Helvex en lavabo, al término de cada jornada realizo la limpieza del área de trabajo.
- Reporte del estado ambiental:** Se da seguimiento a lo relacionado a seguridad e higiene, personal del contratista cuenta con el equipo de seguridad adecuado, la basura que se genera en la obra es depositada en contenedores.
- Maquinaria y Equipo:** La empresa contratista cuenta en la obra con el siguiente equipo: (2) escalera de aluminio, (5) equipo de protección de obra, (1) stock de herramienta menor. (2) amperímetro, (1) voltímetro.
- Personal en Obra:** La empresa contratista cuenta con el siguiente personal en obra: (1) Superintendente de construcción, (1) oficial albañil, (1) ayudante albañil y (1) oficial eléctrico, (2) ayudantes eléctricos, (1) plomero, personal suficiente de acuerdo a las actividades que se están realizando hasta el momento.

Conclusiones: A este periodo se informa que se tiene programado un avance global acumulado del 100% de acuerdo al programa de obra, a la fecha se tiene un avance global real acumulado del 100%, no existiendo atraso en la conclusión de los trabajos, debido a que la contratista durante esta segunda semana aceleró el ritmo de trabajo y así recupero el porcentaje de obra atrasado. Con fecha 30 de septiembre, la contratista informa de la conclusión de los trabajos que amparan el presente contrato.

ELABORÓ

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN



TUXPAN

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

SCT

SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



DATOS DE LA OBRA

CONTRATO No:	APITUX-GOIN-OP-022/16
CONTRATISTA:	C. JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS
OBRA:	"MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE LA ADUANA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO TUXPAN, VER."
MONTO:	\$48,882.24
FECHA DE REPORTE:	03-oct-16

PLAZOS DE EJECUCION

INICIO	ORIGINAL	PRORROGADA	REPROGRAMACION	REAL	AMP PLAZO
TERMINACION	22/09/2016				
PLAZO (DIAS NAT)	30/09/2016				9

PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS


AVANCES SEMANALES FISICOS FINANCIEROS PROGRAMADOS VS. REALES

ACUMULADOS


SEMANA	INICIO	TERMINO	PROGRAMADO	REAL	%PROGRAMADO	% REAL
1	22-sep-16	SEM 1 25/sep/16	0	14,107.74	38.79	28.86
2	26-sep-16	SEM 2 30/sep/16	48,882.24	48,882.24	100.00	100.00

REPORTE SEMANAL N° 02
DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

"GRAFICA AVANCE FINANCIERO SEMANAL PROGRAMADO VS. REAL"

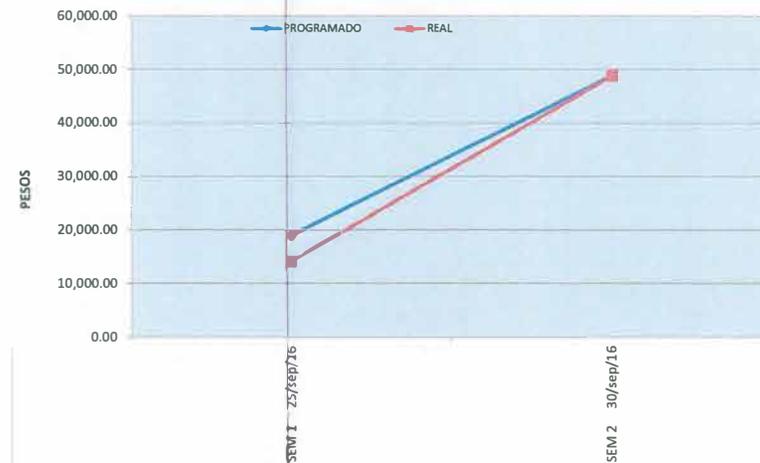

"GRAFICA AVANCE FÍSICO SEMANAL PROGRAMADO VS. REAL"

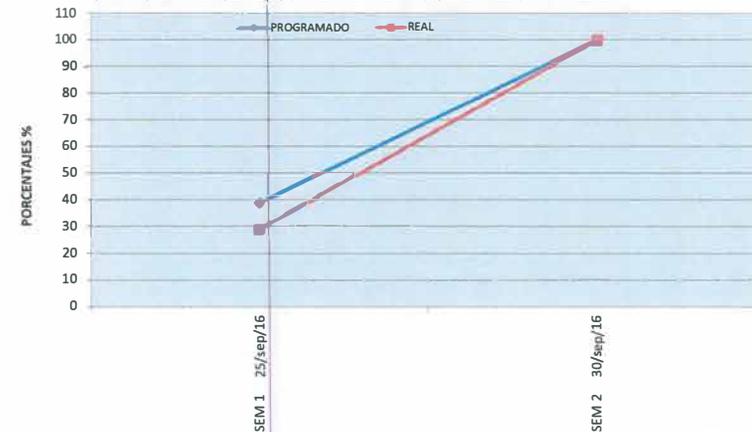

ELABORÓ


ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

ING. BLANCA DE LA ROSA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO	APITUX-GOIN-OP-022/16			REPORTE SEMANAL N° 02 DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
NOMBRE DE LA OBRA:	"MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE LA ADUANA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO TUXPAN, VER."			
PERIODO E LA OBRA	22/09/2016	AL	30/09/2016	
CONTRATISTA:	C. JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS			
FECHA DE REPORTE:	03-oct-16			

REPORTE FOTOGRAFICO

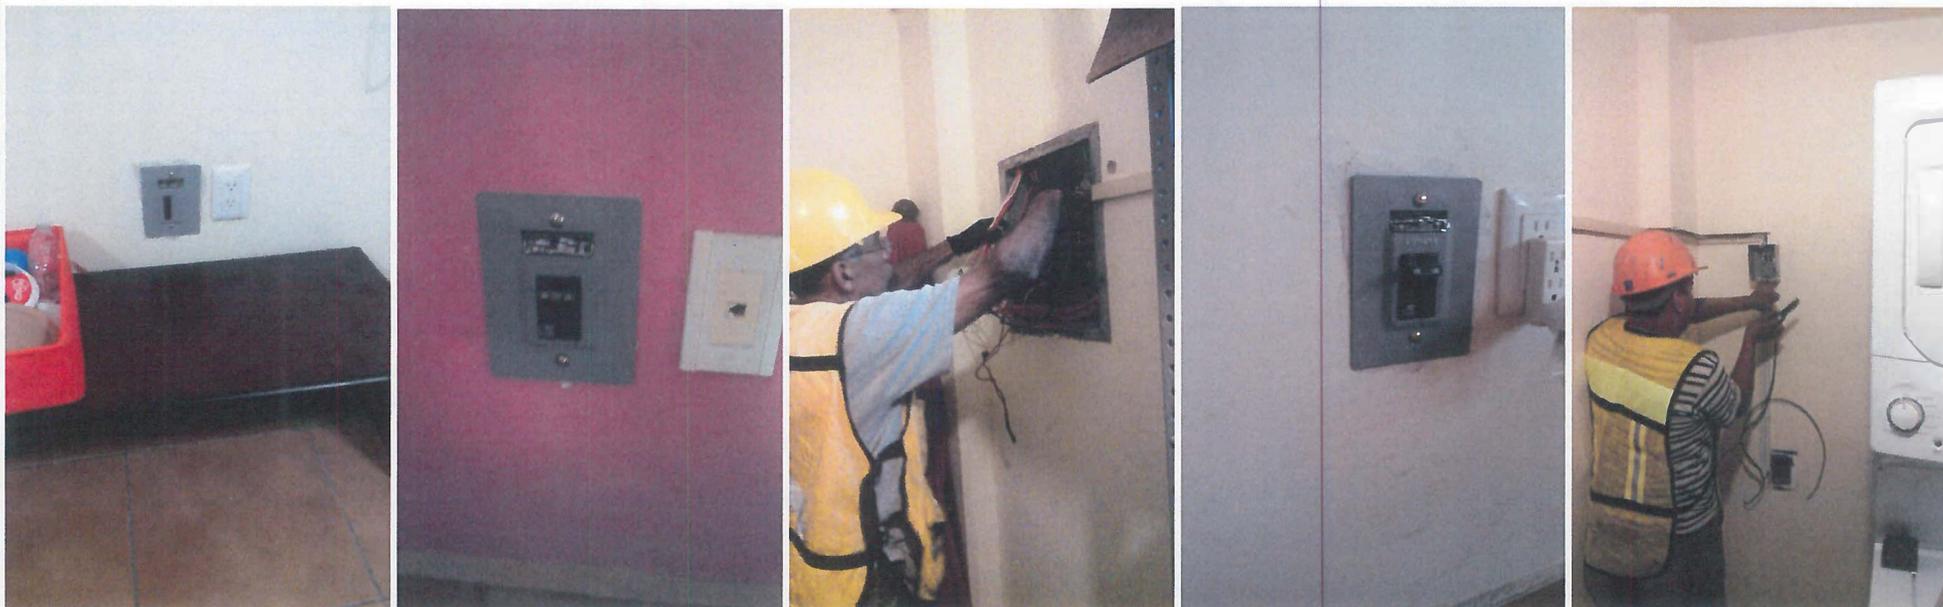

Suministro e instalación de centro de carga QO2 e interruptor termomagnético de 2p x 30 AMPS incluye: cable en canalización a base de canaleta de 1 vía 20x10 mm de pvc, pruebas, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. P.U.O.T.

<p>ELABORÓ</p>  <p>ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA RESIDENTE DE OBRA</p>	<p>VERIFICÓ</p>  <p>ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN</p>	<p>3 DE 7</p>
---	--	----------------------



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN



CONTRATO	APITUX-GOIN-OP-022/16		REPORTE SEMANAL N° 02 DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
NOMBRE DE LA OBRA:	"MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE LA ADUANA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO TUXPAN, VER."		
PERIODO E LA OBRA	22/09/2016	AL 30/09/2016	
CONTRATISTA:	C. JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS		
FECHA DE REPORTE:	03-oct-16		

REPORTE FOTOGRAFICO



Suministro y colocación de lámpara de sobreponeer tipo arbotante LED de 15 W Incluye: consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.

ELABORÓ

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ


ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:
PERIODO E LA OBRA
CONTRATISTA:
FECHA DE REPORTE:

APITUX-GOIN-OP-022/16
"MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE LA ADUANA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO TUXPAN, VER."
22/09/2016 AL 30/09/2016
C. JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS
03-oct-16

REPORTE SEMANAL N° 02
DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

REPORTE FOTOGRAFICO

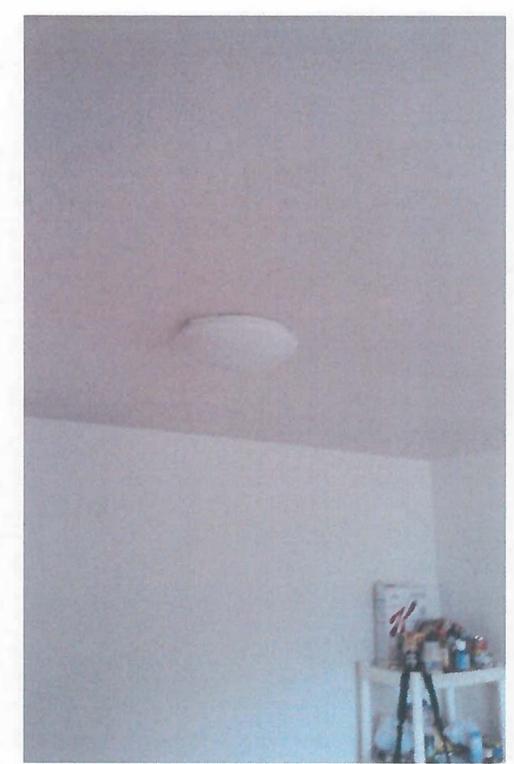

Suministro e instalación de luminaria tipo sobreponer en techo incluye: consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.

ELABORÓ

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

ING. BLANCA BEATRIZ RUIZ MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN

5 DE 7

CONTRATO
NOMBRE DE LA OBRA:
PERIODO E LA OBRA
CONTRATISTA:
FECHA DE REPORTE:

APITUX-GOIN-OP-022/16
"MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE LA ADUANA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO TUXPAN, VER."
22/09/2016 AL 30/09/2016
C. JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS
03-oct-16

REPORTE SEMANAL N° 02
DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

REPORTE FOTOGRAFICO



Suministro e instalación de mezcladora marca HELVEX caliente-fría o similar en calidad, incluye: desmontaje de mezcladora existente y reposición, mangueras coflex para lavabo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.

ELABORÓ

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
RESIDENTE DE OBRA

VERIFICÓ

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTRUCCION



AVANCE DE OBRA VALORIZADO

OBRA: "MANTENIMIENTO MENOR A INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EDIFICIO DE LA ADUANA EN EL INTERIOR DEL RECINTO PORTUARIO TUXPAN, VER."
 CONTRATISTA: C. JOSE ALBERTO DIAZ VARGAS
 IMPORTE DEL CONTRATO: \$: 448,882.24
 CONTRATO: APITUX-GOIN-OP-022/16
 FECHA DE REPORTE: 03-oct-16

REPORTE SEMANAL N° 02
DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERIODO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)	(VOL.)	(\$)
1	Suministro e instalación de salida para alumbrado, incluye: descableado, limpieza de poliductos de 1/2", guiado y cableado aplicando código de colores cable cal.12 AWG, marca condumex o similar en calidad, conexiones y pruebas, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	SALIDA	23.00	\$ 564.50	\$ 12,983.50	26.56	01/12/2016	04/12/2016	4	15.00	14,467.50	8.00	4,516.00	23.00	12,983.50	0.00	0.00
2	Suministro e instalación de contacto duplex polarizado incluye: descableado, limpieza de poliductos de 1/2" guiado y cableado aplicando código de colores cable Cal.10 AWG, marca condumex o similar en calidad conexiones, pruebas, consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	SALIDA	18.00	\$ 664.06	\$ 11,953.08	24.45	04/12/2016	05/12/2016	2	12.00	7,968.72	6.00	3,984.36	18.00	11,953.08	0.00	0.00
3	Suministro e instalación de centro de carga QO2 e Interruptor termomagnético de 2p x 30 AMPS incluye: cable en canalización a base de canaleta de 1 vía 20x10 mm de pvc, pruebas, materiales, mano de obra, equipo, herramienta menor y todo lo necesario para la correcta ejecución del concepto. P.U.O.T.	SALIDA	5.00	\$ 1,293.10	\$ 6,465.50	13.23	06/12/2016	09/12/2016	4	2.00	2,586.20	3.00	3,879.30	5.00	6,465.50	0.00	0.00
4	Suministro y colocación de lámpara de sobreponer tipo arbotante LED de 15 W incluye: consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA.	2.00	\$ 657.86	\$ 1,315.72	2.69	09/12/2016	16/12/2016	8	1.00	657.86	1.00	657.86	2.00	1,315.72	0.00	0.00
5	Suministro e instalación de luminaria tipo sobreponer en techo incluye: consumibles, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA.	3.00	\$ 1,070.22	\$ 3,210.66	6.57	17/12/2016	22/12/2016	6	2.00	2,140.44	1.00	1,070.22	3.00	3,210.66	0.00	0.00
6	Suministro e instalación de mezcladora marca HELVEX caliente-fría o similar en calidad, incluye: desmontaje de mezcladora existente y reposición, mangueras collex para lavabo, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para la correcta ejecución. P.U.O.T.	PZA.	1.00	\$ 12,953.78	\$ 12,953.78	26.50	23/12/2016	24/12/2016	2	1.00	12,953.78	0.00	0.00	1.00	12,953.78	0.00	0.00
TOTALES					48,882.24	100.00					34,774.50		14,107.74		48,882.24		0.00
											34,774.50		14,107.74		48,882.24		0.00
											Porcentaje global de Obra:						100.00
											Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:						100.00
											Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:						0.00

ELABORO

VERIFICO

ING. DIEGO ALBERTO RUIZ LUNA
RESIDENTE DE OBRA

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION
