



REPORTE SEMANAL DEL SERVICIO

FECHA DEL REPORTE: 07-oct-16 Periodo Reportado: REPORTE SEMANA N° 01 DEL 01/10/2016 al 05/10/2016

Contrato: No. APITUX-GOIN-SRO-019/16 Importe contratado S/IVA: \$12,000.00

Obra: "ACTIVIDADES DE PODAS DE REDUCCION DE COPA EN ALTURA DE LOS EJEMPLARES QUE OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD DEL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO LOCALIZADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO, EN EL PUERTO DE TUXPAN,VER."

Contratista: CONSTRUCCIONES PRAGA S.A. DE C.V.

Fecha de Inicio: 01/10/2016 Fecha de Termino: 05/01/2016 Plazo: 23 DIAS

AVANCE FISICO FINANCIERO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad proyecto	Cantidad prog acum	Precio Unitario	Importe Prog Acum	Cantidad acumReal	Avance financ real(\$)	Avance fisico Real (%)
1	"ACTIVIDADES DE PODAS DE REDUCCION DE COPA EN ALTURA DE LOS EJEMPLARES QUE OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD DEL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO LOCALIZADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO, EN EL PUERTO DE TUXPAN,VER."	P.G.	1.00	1.00	12,000.00	\$ 12,000.00	1.00	\$12,000.00	100.00

Avance Programado Acumulado al: 12-dic-16 \$ 12,000.00

Avance Real Acumulado al: 12-dic-16 \$12,000.00

RESUMEN ESTADO FINANCIERO			
	PROGRAMADO	EROGADO	ATRASO
\$	12,000.00	\$12,000.00	\$0.00

COMENTARIOS GENERADOS:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA EN EL PRESENTE PERIODO:

1.- "ACTIVIDADES DE PODAS DE REDUCCION DE COPA EN ALTURA DE LOS EJEMPLARES QUE OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD DEL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO LOCALIZADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO, EN EL PUERTO DE TUXPAN,VER." Se hizo entrega del area de los trabajos el dia 01/10/2016 asi mismo, le fueron indicados los ejemplares a reducir copa, mismos que fueron realizados en el periodo del 01/10/2016 al 05/10/2016 en las siguientes balizas: Baliza "EL COCAL", localizada al margen izquierda del Rio Tuxpan, se realizo el desrame de la palmera de una altura aproximada de 10 metros, quedando unicamente el tronco y la corona de la palma, ya desramada retirando el material producto del corte; en la Baliza "COBOS" localizada al margen derecha Rio Tuxpan, se realizo el desrame de ficus a una altura de 12 a 14 m y arbol de humo de altura aproximada de 9 m mejorando visibilidad de la torre, asi como desrame de arbol de almendro altura variable de 15m, al finalizar los trabajos se realizo el retiro de ramas producto del corte; en la Baliza "SEMINARIO", localizada al margen derecha del Rio Tuxpan, se reducio la copa en cuatro especies de alturas de 9 a 12 metros. Los trabajos concluyeron el dia 05 de octubre mismo que notificado por un escrito por parte del prestador de servicio. El dia 07 de octubre se le comunica mediante oficio No. APITUX-GOIN-1789/2016, que el dia 10 de octubre del presente se llevara a cabo la inspeccion fisica de los trabajos.

2.- **Reporte del estado ambiental:** Se da seguimiento a lo relacionado a seguridad e higiene, personal del contratista cuenta con el equipo de seguridad adecuado, la basura que se genera en la obra es depositada en contenedores, que la maquinaria y equipo que se está utilizando no presente fugas de aceite.

3.-**Maquinaria y Equipo:** La empresa contratista cuenta en la obra con el siguiente equipo: herramienta menor.

4.-**Personal en Obra:** La empresa contratista cuenta con el siguiente personal en obra: (1) cabo, (4) ayudantes para maniobras, dicho personal uso equipo de proteccion de personal basico(casco, botas, overol, guantes, lentes de seguridad y faja lumbar), suficiente de acuerdo a las actividades que se estan realizando hasta el momento.

Conclusiones: . A este periodo que se informa se tiene programado un avance global acumulado del 100% de acuerdo al programa de obra, a la fecha se tiene un avance global real acumulado del 100%, concluyendo los trabajos exitosamente.



TUXPAN

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DE PUERTOS Y TERMINALES DE INGENIERÍA

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONTRUCCION

SCT

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES



AVANCE DEL SERVICIO VALORIZADO

OBRA: "ACTIVIDADES DE PODAS DE REDUCCION DE COPA EN ALTURA DE LOS EJEMPLARES QUE OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD DEL SEÑALAMIENTO MARITIMO LOCALIZADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER. REPORTE SEMANA N° 01 DEL 01/10/2016 al 05/10/2016"
CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES PRAGA S.A. DE C.V.
IMPORTE DEL CONTRATO: \$12,000.00
CONTRATO: APITUX-GOIN-SRO-019/16
FECHA DE REPORTE: 07-oct-16


CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL		ACUM. PERIODO ANTER		ACUM. A ESTE PERIODO		POR EJECUTAR	
										((VOL.))	(\$)	((VOL.))	(\$)	((VOL.))	(\$)	((VOL.))	(\$)
1	"ACTIVIDADES DE PODAS DE REDUCCION DE COPA EN ALTURA DE LOS EJEMPLARES QUE OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD DEL SEÑALAMIENTO MARITIMO LOCALIZADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."	P.G.	1.00	\$	12,000.00	100.00	28/11/2016	20/12/2016	23	1.00	12,000.00	0	0.00	1	12,000.00	0.00	0.00
TOTALES					12,000.00	100.00					12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
										Porcentaje global de Obra:						100.00	
										Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:						100.00	
										Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:						0.00	

EL BOB
ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ
RESIDENTE DE SERVICIO

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

CONTRATO	APITUX-GOIN-SRO-019/16	REPORTE SEMANA N° 01 DEL 01/10/2016 al 05/10/2016
NOMBRE DEL SERVICIO:	"ACTIVIDADES DE PODAS DE REDUCCION DE COPA EN ALTURA DE LOS EJEMPLARES QUE OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD DEL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO LOCALIZADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO, EN EL PUERTO DE	
PERIODO DEL SERVICIO:	01/10/2016 AL 05/10/2016	
PRESTADOR DE SERVICIO:	CONSTRUCCIONES PRAGA S.A. DE C.V	
FECHA DE REPORTE:	07-oct-16	

REPORTE FOTOGRAFICO

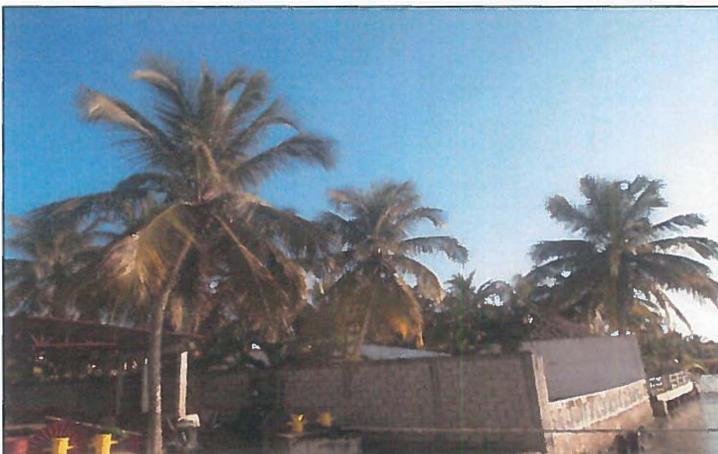

PODA Y DESRAME EN LA BALIZA " EL COCAL" LOCALIZADA AL MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO TUXPAN

ELABORÓ
ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ
RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

CONTRATO

NOMBRE DEL SERVICIO:

PERIODO DEL SERVICIO:

PRESTADOR DE SERVICIO:

FECHA DE REPORTE:

APITUX-GOIN-SRO-019/16

"ACTIVIDADES DE PODAS DE REDUCCION DE COPA EN ALTURA DE LOS EJEMPLARES QUE OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD DEL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO LOCALIZADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO, EN EL PUERTO DE

01/10/2016 AL 05/10/2016


CONSTRUCCIONES PRAGA S.A. DE C.V

07-oct-16

REPORTE SEMANA N° 01

DEL 01/10/2016 al 05/10/2016

REPORTE FOTOGRAFICO

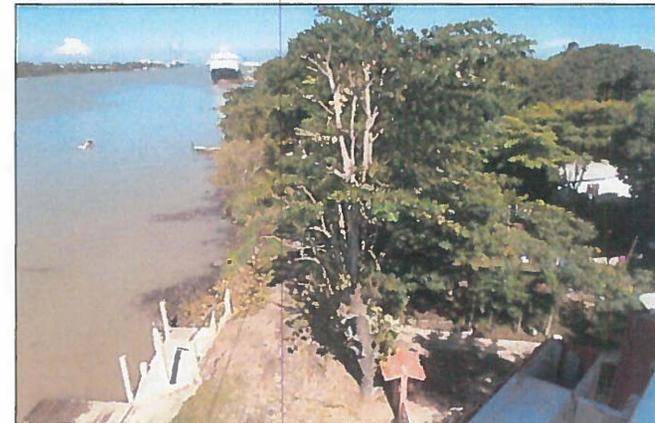

PODA Y DESRAME EN LA BALIZA " COBOS" LOCALIZADA AL MARGEN DERECHA DEL RÍO TUXPAN

ELABORÓ

ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ
 RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ

ING. ANOLFO GAREEZ CRUZ
 ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

CONTRATO

NOMBRE DEL SERVICIO:

APITUX-GOIN-SRO-019/16

"ACTIVIDADES DE PODAS DE REDUCCION DE COPA EN ALTURA DE LOS EJEMPLARES QUE OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD DEL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO LOCALIZADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO, EN EL PUERTO DE

REPORTE SEMANA N° 01

PERIODO DEL SERVICIO:

01/10/2016 AL 05/10/2016

DEL 01/10/2016 al 05/10/2016

PRESTADOR DE SERVICIO:

CONSTRUCCIONES PRAGA S.A. DE C.V

FECHA DE REPORTE:

07-oct-16

REPORTE FOTOGRAFICO



PODA Y DESRAME EN LA BALIZA " COBOS" LOCALIZADA AL MARGEN DERECHA DEL RÍO TUXPAN

ELABORÓ

ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ
RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ

ING. ADOLFO GARCEZ CRUZ
ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA

CONTRATO: APITUX-GOIN-SRO-019/16
NOMBRE DEL SERVICIO: "ACTIVIDADES DE PODAS DE REDUCCION DE COPA EN ALTURA DE LOS EJEMPLARES QUE OBSTRUYEN LA VISIBILIDAD DEL SEÑALAMIENTO MARÍTIMO LOCALIZADO EN LA MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RÍO, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."
PERIODO DEL SERVICIO: 01/10/2016 AL 05/10/2016
PRESTADOR DE SERVICIO: CONSTRUCCIONES PRAGA S.A. DE C.V
FECHA DE REPORTE: 07-oct-16

REPORTE SEMANA N° 01

DEL 01/10/2016 al 05/10/2016

REPORTE FOTOGRAFICO



PODA Y DESRAME EN LA BALIZA "SEMINARIO" LOCALIZADA AL MARGEN DERECHA DEL RÍO TUXPAN

ELABORÓ
ING. ADELINA HERRERA RAMIREZ
RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ
ING. ADOLFO GARCÉZ CRUZ
ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
