



REPORTE MENSUAL DE SERVICIO

FECHA DEL REPORTE: 20-abr-18 **Periodo Reportado:** **REPORTE MENSUAL N° 02 DEL 21 MAR AL 19 DE ABR DEL 2018**

Contrato: No. APITUX-GOIN-SRO-03/18 **Importe contratado S/IVA:** \$270,575.74

Obra: "ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

Contratista: C. JESÚS GERZAHIN HUIDOBRO GONZÁLEZ

fecha de Inicio: 19/02/2018 **Fecha de Termino:** 19/04/2018 **Plazo:** 60 Días

AVANCE FISICO FINANCIERO

Clave	Concepto	Unidad	Cantidad proyecto	Cantidad prog acum	Precio Unitario	Importe Prog Acum	Cantidad acumReal	Avance financ real(\$)	Avance fisico Real (%)
PU	MUELLE FISCAL APITUX								
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES								
1.1	INSPECCIÓN DETALLADA DEL MUELLE FISCAL	SERVICIO	1.00	1.00	\$ 94,615.28	\$ 94,615.28	1.00	\$94,615.28	100.00
1.2	DIAGNÓSTICO DEL MUELLE FISCAL	REPORTE	1.00	1.00	\$ 45,223.56	\$ 45,223.56	1.00	\$45,223.56	100.00
2	PROYECTO EJECUTIVO								
2.1	PROYECTO DE REPARACIÓN DEL MUELLE FISCAL	PROYECTO	1.00	1.00	\$ 67,699.56	\$ 67,699.56	1.00	\$67,699.56	100.00
3	DOCUMENTOS FINALES								
3.1	PAQUETE DE CONCURSO	DOCUMENTO	1.00	1.00	\$ 23,745.62	\$ 23,745.62	1.00	\$23,745.62	100.00
3.2	REPORTE FINAL	REPORTE	1.00	1.00	\$ 39,291.72	\$ 39,291.72	1.00	\$39,291.72	100.00
Avance Programado Acumulado al: 19-abr-18						\$ 270,575.74			
Avance Real Acumulado al: 19-abr-18								\$270,575.74	

Monto Contratado: \$270,575.74		%	RESUMEN		
Porcentaje Global de obra Programada:		100.00	ESTADO FINANCIERO		
Porcentaje de cumplimiento Global de obra Real:		100.00	PROGRAMADO	EROGADO	ATRASO
Desviación:		0.00	\$ 270,575.74	\$270,575.74	\$0.00

COMENTARIOS GENERADOS:

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA CONTRATISTA EN EL PRESENTE PERIODO:

1.- Inicio de los trabajos de rehabilitacion de muro. Con esta fecha la empresa contratista realizo prosiguió con el reporte de diagnostico del muelle fiscal, se prosiguió con el proyecto de reparacion del muelle asi mismo se realiza paquete para concurso precios unitarios, y volumenes a ejecutar en la obra, por ultimo se realizo la entrega de reporte final planos de proyecto.

2.- Reporte del estado ambiental: Se da seguimiento a lo relacionado a seguridad e higiene, personal del contratista cuenta con el equipo de seguridad adecuado, la basura que se genera en la obra es depositada en contenedores.

3.-Maquinaria y Equipo: La empresa contratista cuenta en la obra con el siguiente equipo: (1) equipo de proteccion de obra,(1) lancha con motor fuera de borda.

4.-Personal en Obra: La empresa contratista cuenta con el siguiente personal en obra: (1) Superintendente de construcción, (1) cabo de obra, (4) ayudantes generales, personal suficiente de acuerdo a las actividades que se están realizando hasta el momento.

Conclusiones: A este periodo que se informa se tiene programado un avance global acumulado del 100.00% de acuerdo al programa de obra, a la fecha se tiene un avance global real acumulado del **100%**, terminado la ejecucion de los servicios.

ELABORÓ ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA. RESIDENTE DE SERVICIO	VERIFICÓ ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES. JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN	1 DE 4
---	--	--------



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION



DAITOS DE LA OBRA

CONTRATO No: APTUX-GOIN-SRO-03/18
 CONTRATISTA: C. JESÚS GERZAHIN HUIDOBRO GONZÁLEZ
 OBRA: "ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APTUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."
 MONTO: \$270,575.74
 FECHA DE REPORTE: 20-abr-18

PLAZOS DE EJECUCION		REAL	AMP PLAZO
ORIGINAL	PRORROGADA	REPROGRAMACION	
19/02/2018			
19/04/2018			
60			


PROGRAMA DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS

SEMANA	INICIO	TERMINO	PROGRAMADO		REAL		% REAL
			PROGRAMADO	%PROGRAMADO	REAL	%REAL	
1	19-feb-18	SEM 1 20/Mar/18	\$ 169,273.43		\$ 117,227.06	62.56	43.33
2	22-mar-18	SEM 2 19/Abr/18	\$ 270,575.74		\$ 270,575.74	100.00	100.00


AVANCES SEMANALES FISICOS FINANCIEROS PROGRAMADOS VS. REALES

PROGRAMADO		REAL	
SEM 1	SEM 2	SEM 1	SEM 2
20/Mar/18	19/Abr/18	20/Mar/18	19/Abr/18
43.33%	100.00%	43.33%	100.00%

"GRAFICA AVANCE FINANCIERO SEMANAL PROGRAMADO VS. REAL"

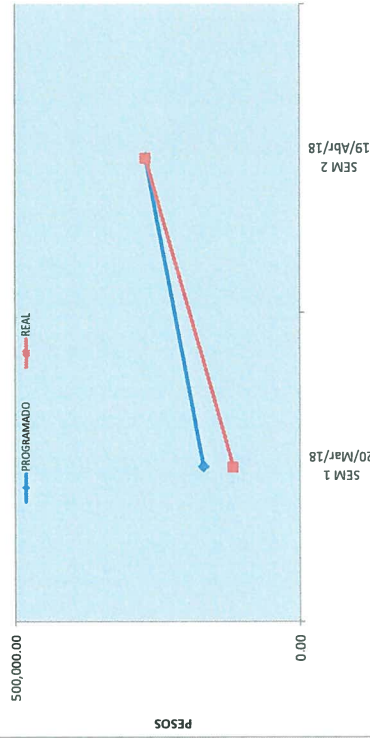

"GRAFICA AVANCE FISICO SEMANAL PROGRAMADO VS. REAL"

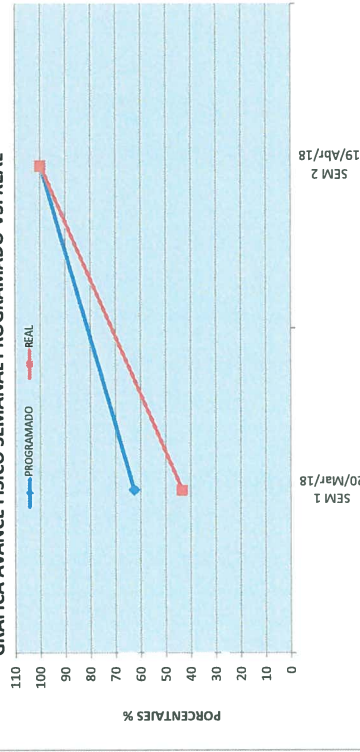

ELABORO

Ivan Zarate Zurbiria
 ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA,
 RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICO

Beatriz Cruz Morales
 ING. BEATRIZ BEATRIZ CRUZ MORALES,
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION



CONTRATO

APITUX-GOIN-SRO-03/18

NOMBRE DE LA OBRA:

"ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."

PERIODO E LA OBRA

09/05/2016 AL 27/06/2016

CONTRATISTA:

C. JESÚS GERZAHIN HUIDOBRO GONZÁLEZ

FECHA DE REPORTE:

20-abr-18

REPORTE MENSUAL N° 02
DEL 21 MAR AL 19 DE ABR DEL 2018

ITEM	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
2	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
3	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
4	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
5	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
6	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
7	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
8	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
9	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
10	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
11	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
12	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
13	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
14	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
15	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
16	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
17	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
18	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
19	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00
20	ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.	1	1	1,000,000.00	1,000,000.00

REPORTE FOTOGRAFICO

CATALOGO DE CONCEPTOS

PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX, EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.

CANTIDADES DE OBRA

MEMORIA DE CALCULO

PLANOS DE INPECCION

PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APITUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER.

REPORTE FINAL

ABRIL 2018

MEMORIA DE CALCULO

REPORTE FINAL

ELABORÓ

ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA.
RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES.
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN



ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TUXPAN, S.A. DE C.V.
 GERENCIA DE OPERACIONES E INGENIERIA
 SUBGERENCIA DE INGENIERIA Y ECOLOGIA
 DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION



REPORTE MENSUAL N° 02
 DEL 21 MAR AL 19 DE ABR DEL 2018

OBRA: "ELABORACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LLEVAR A CABO EL MANTENIMIENTO MAYOR AL MUELLE FISCAL DE LA APTUX EN EL PUERTO DE TUXPAN, VER."
 CONTRATISTA: C. JESUS GERZAHIN HUIDOBRO GONZÁLEZ
 IMPORTE DEL CONTRATO \$270,575.74
 CONTRATO: APTUX-GOIN-SFO-03/18
 FECHA DE REPORTE: 20-abr-18

AVANCE DE OBRA VALORIZADO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD PROYECTO	P.U.	IMPORTE	% TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	DURACION EN DIAS	PERIODO ACTUAL (VOL.)	ACUM. PERDO ANTER (VOL.)	ACUM. A ESTE PERIODO (VOL.)	PO R E J E C U T A R (VOL.)	(\$)	(\$)	(\$)
PU	MUELLE FISCAL APTUX															
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES															
1.1	INSPECCION DETALLADA DEL MUELLE FISCAL	SERVICIO	1.00	\$ 94,615.28	40.91		19/02/2018	25/02/2018	7	0.00	1.00	1.00	0.00	94,615.28	0.00	0.00
1.2	DIAGNOSTICO DEL MUELLE FISCAL	REPORTE	1.00	\$ 45,223.56	19.55		26/02/2018	28/02/2018	3	0.50	0.50	1.00	0.50	22,611.78	45,223.56	0.00
2	PROYECTO EJECUTIVO															
2.1	PROYECTO DE REPARACION DEL MUELLE FISCAL	PROYECTO	1.00	\$ 67,699.56	29.27		01/03/2018	15/04/2018	46	1.00	0.00	1.00	0.00	67,699.56	0.00	0.00
3	DOCUMENTOS FINALES															
3.1	PAQUETE DE CONCURSO	DOCUMENTO	1.00	\$ 23,745.62	10.27		09/04/2018	18/04/2018	10	1.00	0.00	1.00	0.00	23,745.62	0.00	0.00
3.2	REPORTE FINAL	REPORTE	1.00	\$ 39,291.72	16.99		18/04/2018	24/04/2018	7	1.00	0.00	1.00	0.00	39,291.72	0.00	0.00
TOTALES													114,056.96	117,227.06	231,284.02	0.00
Porcentaje global de Obra:													114,056.96	117,227.06	231,284.02	0.00
Porcentaje global de Obra Real Ejecutada:																100.00
Porcentaje global de obra faltante por ejecutar:																0.00

ELABORÓ

ING. IVAN ZARATE ZUBIRIA
 RESIDENTE DE SERVICIO

VERIFICÓ

ING. BLANCA BEATRIZ CRUZ MORALES
 JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS Y CONSTRUCCION
