


AVANCE FISICO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-4/2019

PROVEEDOR: ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES DE
ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

AVANCE	PORCENTAJE
may-19	4.10%
jun-19	8%
jul-19	11.20%
ago-19	14.200%
sep-19	17.200%

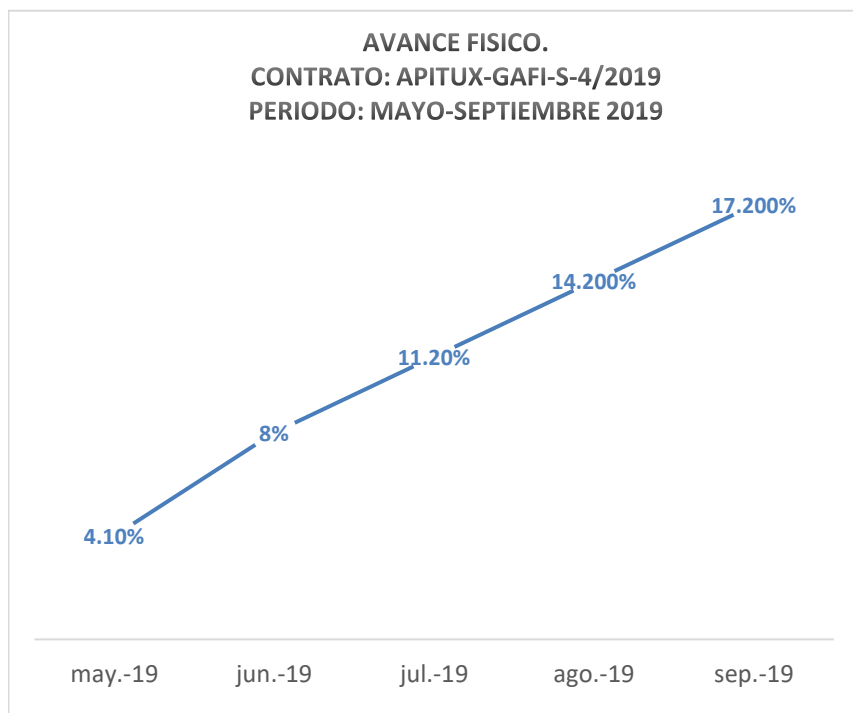

VIGENCIA CONTRATO: 2 DE MAYO DEL 2019 AL 30 DE ABRIL DEL 2021

AVANCE PROGRAMADO 2019 (%)	33%
AVANCE PROGRAMADO 2020 (%)	50%
AVANCE PROGRAMADO 2021 (%)	16.67%
	<hr/>
	100%

AVANCE FINANCIERO

CONTRATO: APITUX-GAFI-S-4/2019

PROVEEDOR: ESPECIALISTAS EN INSTALACIONES DE ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

AVANCE	PORCENTAJE
PROGRAMADO	17%
REAL	17%

